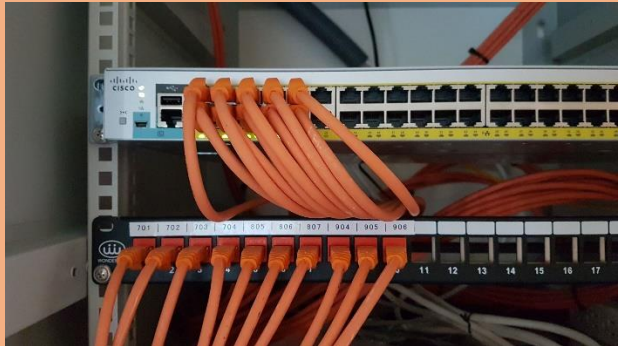



學校	鳳鳴國中	時間	2019.9.18
自主檢核驗收改善單			
1. ☒ 室內外管材水平垂直面依規範用 PVC。 2. ☒ 各網路線路須以水平或垂直佈放 (所有配管、線、槽整齊置放或架設(吊管))。 3. ☒ 進線須全程配管包覆，穿牆、門窗。 4. ☒ 管路標示編號標示。 5. ☒ 配管使用單邊夾或雙邊夾採螺絲固定。 6. ☐ 新管線依附舊管時使用金屬束帶。 7. ☒ 管線進教室使用快接。 8. ☒ 管線進教室矽利康補洞。		未依規範施作項目： 2. ☒ 各網路線路須以水平或垂直佈放 3. ☒ 進線須全程配管包覆，穿牆、門窗。 4. ☒ 管路標示編號標示。 8. ☒ 管線進教室矽利康補洞。 16. ☒ 機櫃線圈標號&教室資訊盒標籤標示清楚 18. ☒ 舊 AP 移除。	
9. ☒ 教室配管線到 AP 資訊插座。 10. ☒ AP 教室(中央前後 1/3，離四周牆面一米以上)。 11. ☒ 資訊插座與 AP 距離不超過 20 公分以內位置(插座需外露) 12. ☒ 舊資訊盒全面更新(含內部接頭)並用二根螺絲固定。 13. ☒ 設備 AP、5Port 固定確實(5Port 需用二根螺絲固定)。 14. ☒ 舊資訊盒 Uplink 線連接到 5Port Switch。 15. ☒ 新機櫃、移動機櫃，Panel、UTP、光纖線作業確實 16. ☒ 機櫃線圈標號&教室資訊盒標籤標示清楚 17. ☒ L2 Cisco2960 光纖跳線到 Dlink 3620 (10G)。 18. ☒ 舊 AP 移除。			

前瞻第一階段工程改善事項

地點位置	照片	改善事項&目標	備註
B棟 2F 教室外吊管下垂 (B2-1~B2-2 間)		吊架距離太遠造成管線下垂，需要增加吊架或固定	2. 各網路線路須以水平或垂直佈放(所有配管、線、槽整齊置放或架設(吊管))
B2-4 教室外 C2-4 教室外 C3-4 教室外 D2-4 教室外	   	PVC 管末端需密封	3. 進線須全程配管包覆，穿牆、門窗。

2F 管道間 到教務處 外機櫃 4F 管道間 到圖書館 外機櫃		PVC 管需補貼標籤標示	4. ㊟管路標示 編號標示。
1F 總務處 2F 教務處 4F 圖書館		銑洞處需完全填充	8. ㊟管線進教 室矽利康補洞。
D2-2 教室 D2-3 教室 D2-4 教室 C4-3 教室		銑洞處需完全填充	8. ㊟管線進教 室矽利康補洞。

	  		
4F 圖書館 外機櫃 2F 教務處 外機櫃	 	1. 機櫃線圈標號要以<u>教室建築代號</u>標號，不是以班級標示。 2. 網路線需有 UIP 標示套環 3. 光纖線需貼標示	16. 機櫃線圈標號&教室資訊盒標籤標示清楚
各班教室 (共 20 間)	 (僅以其中二間教室照片代表)	無線 AP 教室資訊盒標籤標示要以<u>教室建築代號</u>標號，不是以班級標示。	16. 機櫃線圈標號&教室資訊盒標籤標示清楚

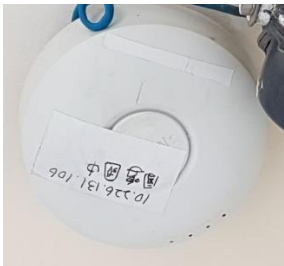各班教室 (共 20 間)	 (僅以其中二間教室照片代表)	教室資訊盒標籤要標示清楚	16. ㊟機櫃線圈標號&教室資訊盒標籤標示清楚					
B4-1 教室外 C4-2 教室外 D4-2 教室外 B2-3 教室外 C2-2 教室外 D2-2 教室外 (六台)		1. 有六顆 AP 需要移動安裝 2. 移動設備是在 <table><tr><td>1. B4-1 教室外</td></tr><tr><td>2. C4-2 教室外</td></tr><tr><td>3. D4-2 教室外</td></tr><tr><td>4. B2-3 教室外</td></tr><tr><td>5. C2-2 教室外</td></tr><tr><td>6. D2-2 教室外</td></tr></table> 3. 裝設位置: 1. 輔導處機櫃旁天花板 2. 教務處機櫃旁與生物實驗室中間走廊天花板上。 3. 學務處機櫃旁天花板。 4. 幼稚園 A2-2 原網點上方天花板。 5. 總務處機櫃旁走廊天花板 6. 圖書館機櫃旁走廊天花板。 18. ㊟舊 AP 移除。	1. B4-1 教室外	2. C4-2 教室外	3. D4-2 教室外	4. B2-3 教室外	5. C2-2 教室外	6. D2-2 教室外
1. B4-1 教室外								
2. C4-2 教室外								
3. D4-2 教室外								
4. B2-3 教室外								
5. C2-2 教室外								
6. D2-2 教室外								

組長確認:

教育局確認:
